



agro
landschap
natuur

Natuurcompensatie Laarakker

Voortgangsrapportage 3e kwartaal 2012

(juli t/m september)

Ism: Stichting Raamvallei
ANV-Raamvallei
IGP-Laarakkerse Waterleiding

Areal, oktober 2012

Ondernomen activiteiten, 3^e kwartaal 2012

| Activiteit | Toelichting |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5 juli 2012 overleg communicatie Laarakker | Opzetten opening EVZ |
| 24 augustus 2012, overleg werkgroep | Voortgang, actie |
| 24 september N&M gem. Cuijk | Overleg groene organisaties Cuijk |

Geplande activiteiten, 4^e kwartaal 2012


| Activiteit | Toelichting |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Afsluiten contracten lijnelementen | Concepten concreet maken |
| Overleg met deelnemers en waterschap | Afstemmen aanleg en onderhoud EVZ |
| Organiseren bijeenkomst Sint Agatha | Gebiedsgerichte aanpak met ANV, DLG, Waterschap |
| Mede-organiseren opening EVZ | Ism waterschap, DLG en gem. Cuijk |

Overzicht contracten

| Contract-nummer | Betaald in fonds | Aanleg betaald door RBL | Status aanleg | Totale lengte houtwal/haag (m) | Berekende lengte aanvullende elementen (m) |
|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | € 11.556,00 | € 8.089,00 | contract en aangelegd | 0 | 286 |
| 2 | € 16.440,00 | € 4.603,00 | contract en aangelegd | 376 | |
| 3 | € 46.946,00 | € 14.785,00 | contract en aangelegd | 1394 | 170,88 |
| 4 | € 12.690,00 | € 8.883,00 | contract en aangelegd | | 450 |
| 5 | € 17.430,00 | € 12.201,00 | contract en aangelegd | | 664 |
| 6 | € 16.038,00 | € 11.227,00 | contract en aangelegd | | 522 |
| 7 | € 10.125,00 | € 3.075,00 | contract en aangelegd | 250 | 150 |
| 8 | € 9.072,00 | € 6.350,00 | contract en aangelegd | | 228 |
| 9 | € 39.465,00 | € 18.661,00 | contract en aangelegd | 474 | 446 |
| 10 | € 8.040,00 | € 2.251,00 | contract | 268 | |
| 11 | € 17.040,00 | € 4.771,00 | contract | 568 | |
| 12 | € 19.055,00 | € 5.479,00 | contract en aangelegd | 651 | 50 |
| 13 | € 4.374,00 | € 1.466,00 | contract en aangelegd | 116 | 72 |
| 14 | € 34.920,00 | € 23.083,00 | contract en aangelegd | | 960 |
| 15 | € 4.050,00 | € 1.134,00 | contract | 135 | |
| 18 | € 3.420,00 | € 2.394,00 | contract en aangelegd | | 136 |
| 19 | € 12.345,00 | € 6.956,00 | contract en aangelegd | 217 | 300 |
| 20 | € 11.220,00 | € 3.142,00 | contract en aangelegd | 374 | |
| 21 | €14,130,00 | € 3.956,00 | contract en aangelegd | 471 | |
| 22 | € 18.054,00 | € 11.353,00 | contract en aangelegd | 102 | 302 |
| 23 | € 3.150,00 | € 2.205,00 | contract | | 130 |
| 24 | € 4.800,00 | € 1.344,00 | contract | 160 | |
| 25 | € 3.810,00 | € 1.067,00 | beschikt en aangelegd | 127 | |
| 26 | € 5.100,00 | € 1.428,00 | contract | 170 | |
| A1 | | | aangelegd | 300 | |
| A2 | € 0,00 | | contract | | 36 |
| A3 | | | aangelegd | | 180 |
| A4 | € 0,00 | € 0,00 | aangelegd | 145 | 100 |
| c1 | | | concept | 455 | |
| c2 | | | concept | 919 | |
| Subtotaal | € 329.140,00 | € 159.903,00 | | 7.227 | 5.183 |
| besteed | | | € 489.043,00 | 12.410 | m |
| Begroot | € 480.000,00 | € 131.000,00 | € 611.000,00 | 15.000 | m |
| marge | € 150.860,00 | -€ 28.903,00 | € 121.957,00 | 2.590 | m |

Lengte totaal: 12,4 km.

Overzicht in plangebied

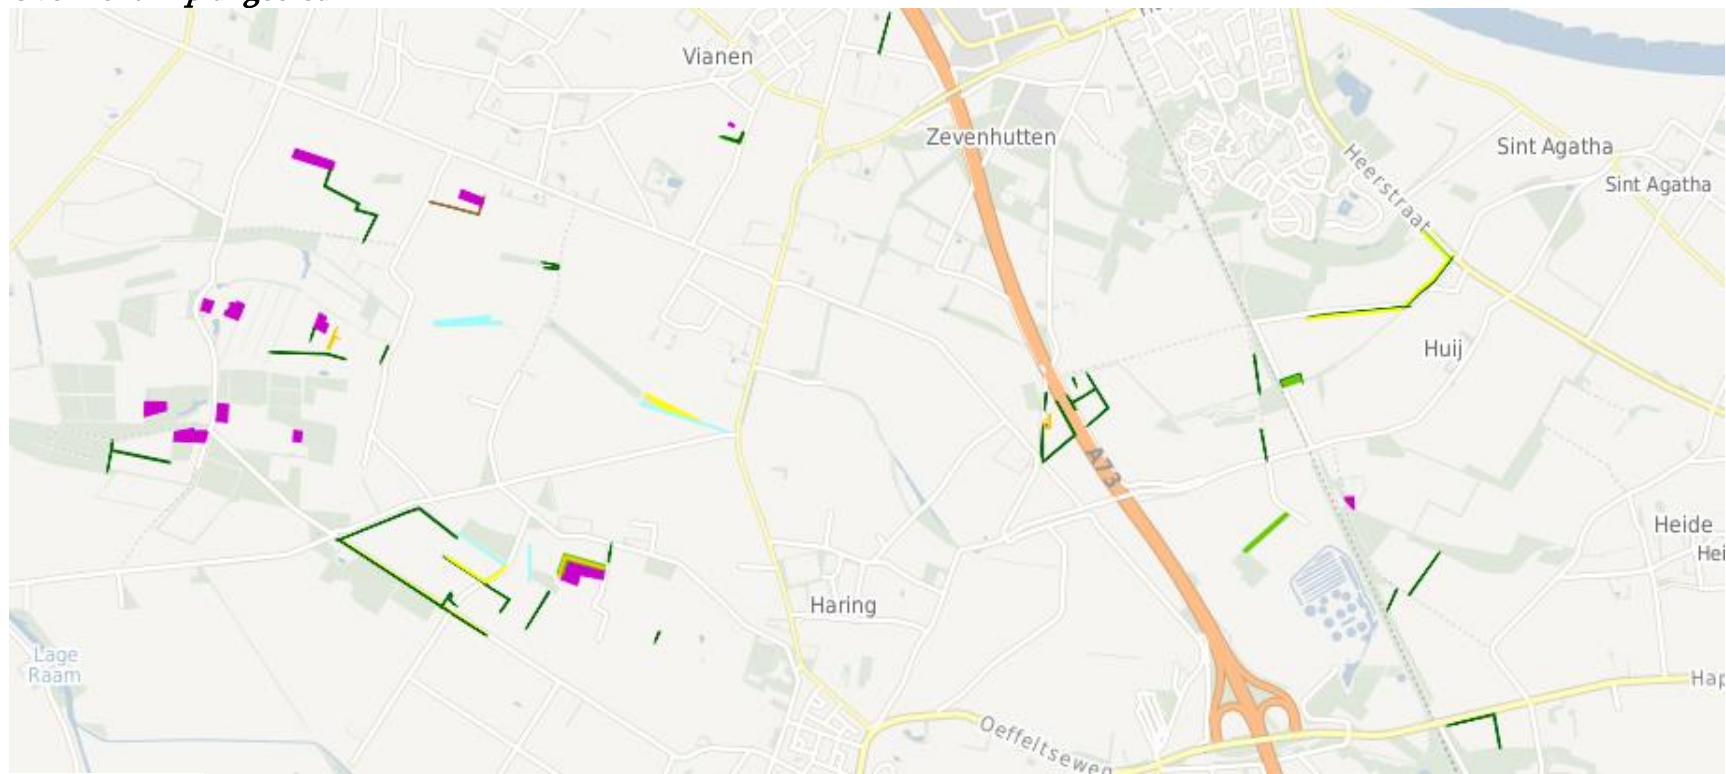

- grasland
- houtwal/heg
- fruit, hoogst
- grasland

Inzoemen, elementen bestuderen of stand van zaken bijhouden op: <http://arealagro.bridgis.nl>

Username: LaarakkerKijk Password: 15km
